

## Stand der Investitionsrechnung 2024 (Realisierungsgrad)

### 1 AUSGANGSLAGE

Mit der Jahresrechnung wird dem Parlament jährlich Rechenschaft über die getätigten Investitionen und damit auch über den Realisierungsgrad abgelegt.

Der Grosse Gemeinderat hat den Gemeinderat zusätzlich beauftragt, jeweils in den Monaten Mai und Oktober über den Stand der Investitionen zu informieren.

### 2 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG

Im Investitionsplan 2024<sup>1</sup> sind Gesamtinvestitionen von rund CHF 23 Mio. vorgesehen. Bis Ende März 2024 sind insgesamt CHF 1,2 Mio. zu Lasten der Investitionsrechnung verbucht worden.


Gemäss der neuesten Prognose geht der Gemeinderat davon aus, dass per Ende 2024 insgesamt rund CHF 21 Mio. verbucht sein werden. **Der Realisierungsgrad würde somit rund 90 % (Rechnung 2023: 62 %) betragen**, insofern die Rechnungsstellung im 2024 erfolgt. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist zu erwähnen, dass sich im Jahr 2024 mit dem Gemeindehaus und der Schulanlage Melchenbühl inkl. der Containerschule zwei Grossinvestitionen im Bau befinden.

### 3 STAND DER INVESTITIONSRECHNUNG PRO SACHGRUPPE

Die Entwicklung der verschiedenen Sachgruppen sieht aktuell wie folgt aus:


---

<sup>1</sup> [https://www.muri-guemligen.ch/public/upload/assets/429/20231124%20Investitionsplan\\_2023-2028.pdf?fp=2](https://www.muri-guemligen.ch/public/upload/assets/429/20231124%20Investitionsplan_2023-2028.pdf?fp=2)

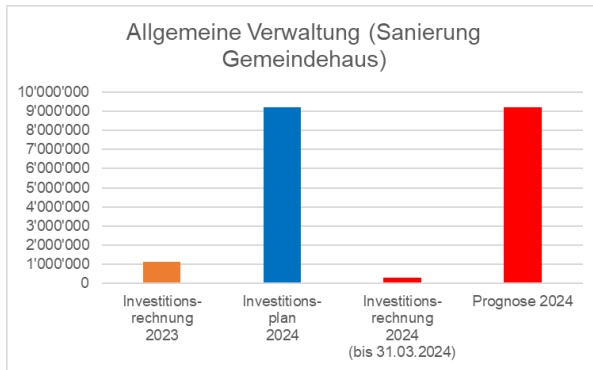


#### Allgemeine Verwaltung (Sanierung Gemeindehaus):

Die Prognose basiert auf dem aktuellen Zahlungsplan des Bauprojektes "Sanierung Gemeindehaus". Die Bauarbeiten verlaufen derzeit plangemäss, weshalb die Prognose dem Plan entspricht.

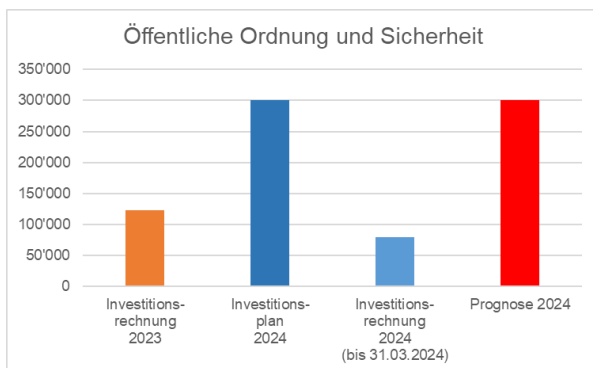

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Im Investitionsplan ist die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr vorgesehen (Spezialfinanzierung). Derzeit gehen wir davon aus, dass dieses gemäss Plan beschafft wird.

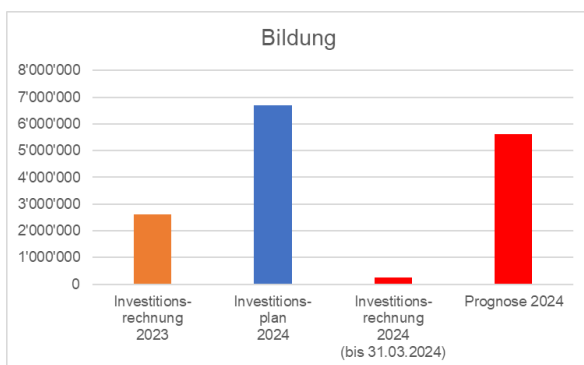


#### Bildung:

Der Investitionsplan dürfte um rund CHF 1 Mio. unterschritten werden.

Die spätere Umsetzung folgender Vorhaben (Hauptabweichungen) führen zur Unterschreitung:


- Umbau Beleuchtung auf LED in Schulanlagen - CHF 0,8 Mio.
- Umnutzung Rainweg 11 zur Tagesschule - CHF 0,3 Mio.

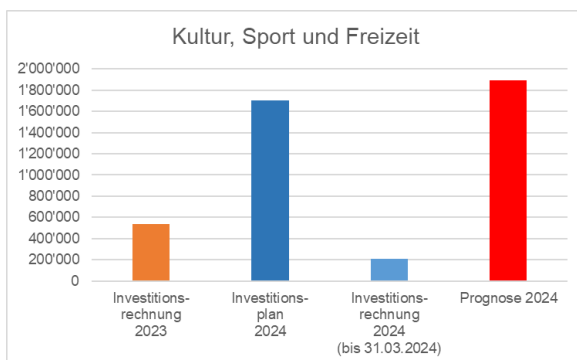

#### Kultur, Sport und Freizeit:

Gemäss aktueller Prognose wird der Investitionsplan um rund CHF 190'000 überschritten werden.

Einerseits werden die Kosten für den Umbau der Beleuchtung im Mattenhofsaal teurer ausfallen als geplant. Andererseits sind noch Abschlussarbeiten im Aarebad (Verbundsteine + Filteranlage / Technik) angefallen.

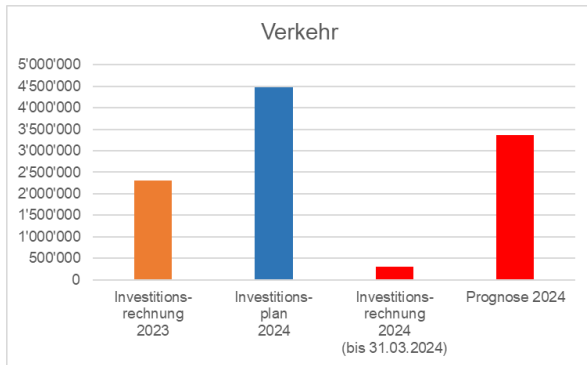


#### Verkehr:

Die Prognose liegt derzeit um CHF 1,1 Mio. unter dem Investitionsplan. Folgende Investitionen erfolgen frühestens ab dem Jahr 2025 (Minderinvestitionen von CHF 0,9 Mio.):

- Sanierung Tannenweg
- Sanierung Tannackerstrasse
- Sanierung Breichtenstrasse
- Sanierung Kräyigenweg

Die Belagssanierung im Strassenbau erfolgt jeweils nach Abschluss der Arbeiten der Gemeindebetriebe Muri (gbm) und steht in direkter Abhängigkeit der Planung der gbm. Trotz der tieferen Investitionen im Jahr 2024 wird von keinem Investitionsstau ausgegangen.

Weiter wurde die Strassenwischmaschine des Werkhofes umfassend revidiert, weshalb diese später als geplant ersetzt werden kann.

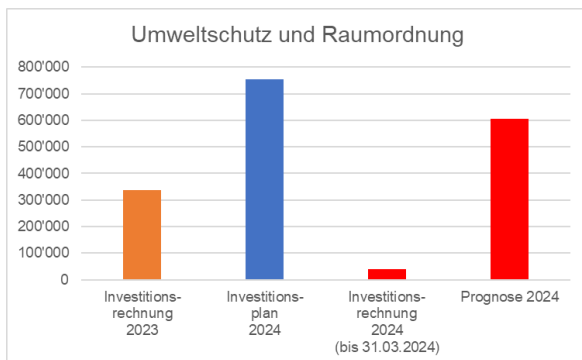

#### Umweltschutz und Raumordnung:

In der Sachgruppe wird mit einer Unterschreitung der Investitionen von CHF 150'000 ausgegangen.

Die Unterschreitung ist auf folgende Vorhaben der Raumplanung zurückzuführen:

- Entwicklung Tannental - CHF 70'000
- Uferschutzplan - CHF 25'000
- Diverse - CHF 55'000

## 4

### ANTRAG

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

### B e s c h l u s s

zu fassen:

Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Stand der Investitionsrechnung 2024.

Gümligen, 29. April 2024

GEMEINDERAT MURI BEI BERN  
Der Präsident                      Die Sekretärin

Stephan Lack                      Corina Bühler
